


Le déploiement FttH Orange

Quartier Boulouris
Avancement Mai 2019




Principes de déploiement et définitions

logts couverts ou
adressables
Fibre dans la rue


Raccordables / Eligible
Fibre dans l'immeuble

Raccordés
Fibre dans le logement

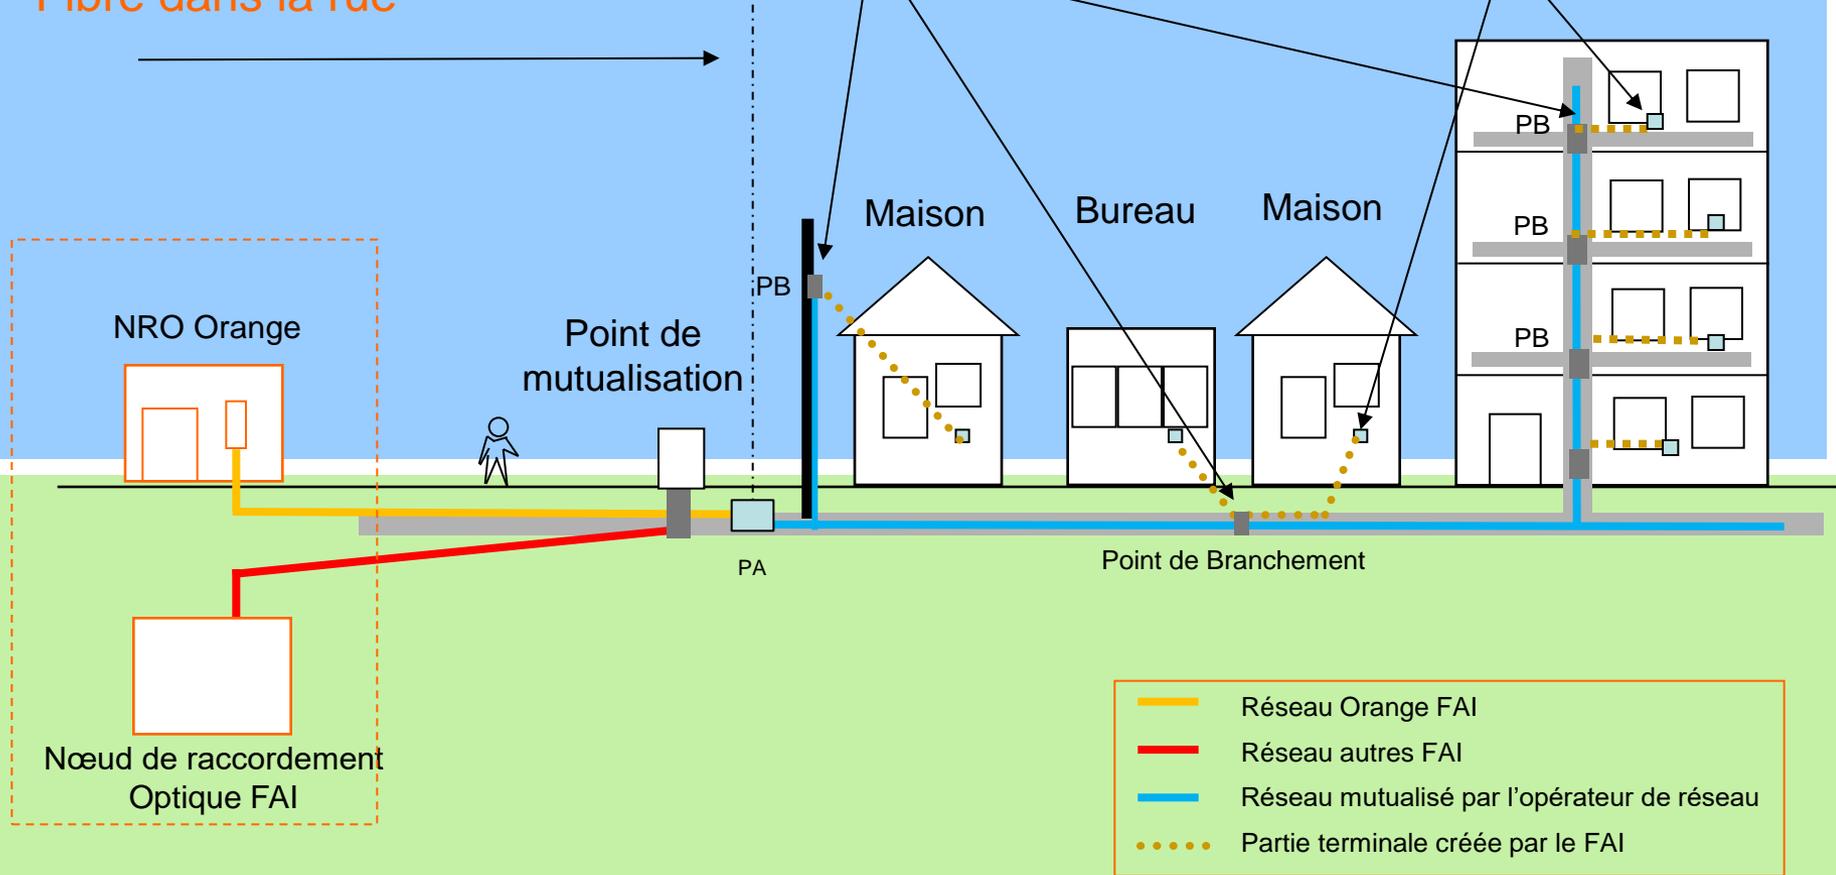

Déploiement sur 4 lots

Sur Saint-Raphaël, Orange fait appel au partenaire **Scopelec** pour déployer son réseau FTTH. **Scopelec** a en charge de la totalité du déploiement : de la recherche du syndic à l'obtention de l'accord syndic lorsque celui-ci est nécessaire, en passant par les études du réseau jusqu'à la réalisation des travaux.

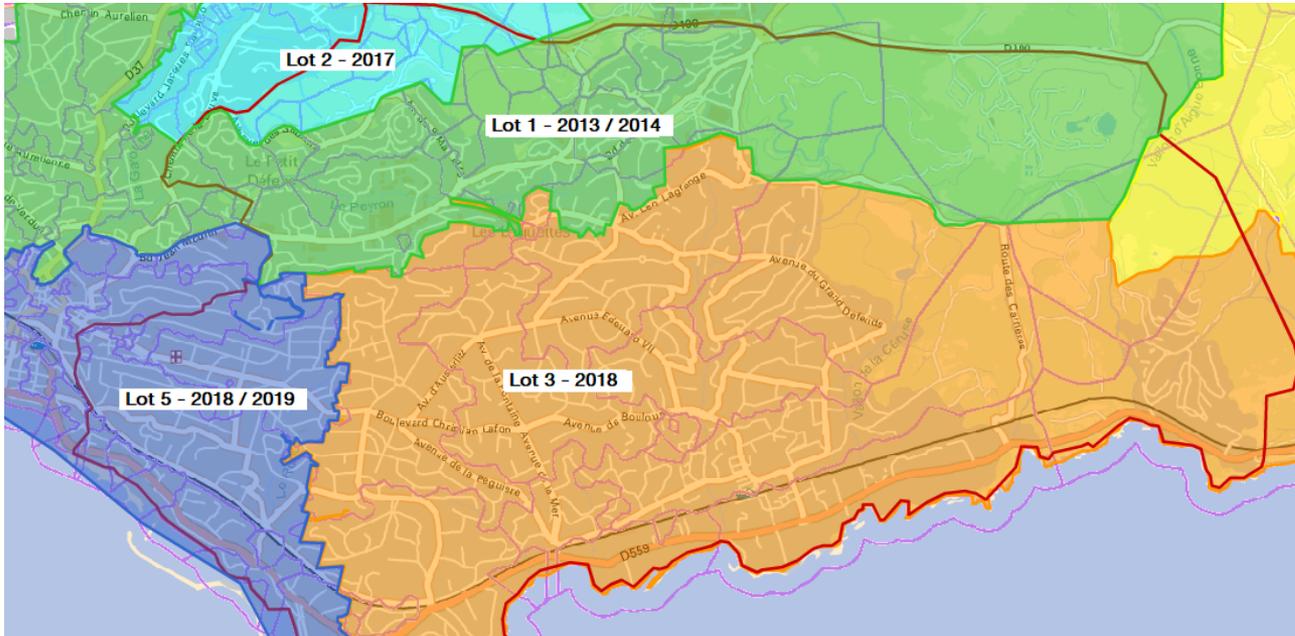


La zone du CIL Bououris fait l'objet d'un déploiement en 4 lots distincts.

- Lot 1 constitué de **9 armoires techniques** (Point de Mutualisation de Zone) desservant 3 425 locaux
- Lot 2 constitué de **1 armoire technique** desservant 81 locaux
- Lot 3 constitué de **21 armoires techniques** permettant de desservir 7 080 locaux
- Lot 5 constitué de **15 armoires techniques** permettant de desservir 4 274 locaux

Soit globalement sur ce périmètre, **14 869 locaux** identifiés à ce jour pour 46 armoires techniques

Etat d'avancement du lot 1, au nord du quartier

Un lot démarré fin 2013 qui est à ce jour couvert (adressable) à **97 %** et fait ressortir un taux d'éligibilité des locaux de **88 %**

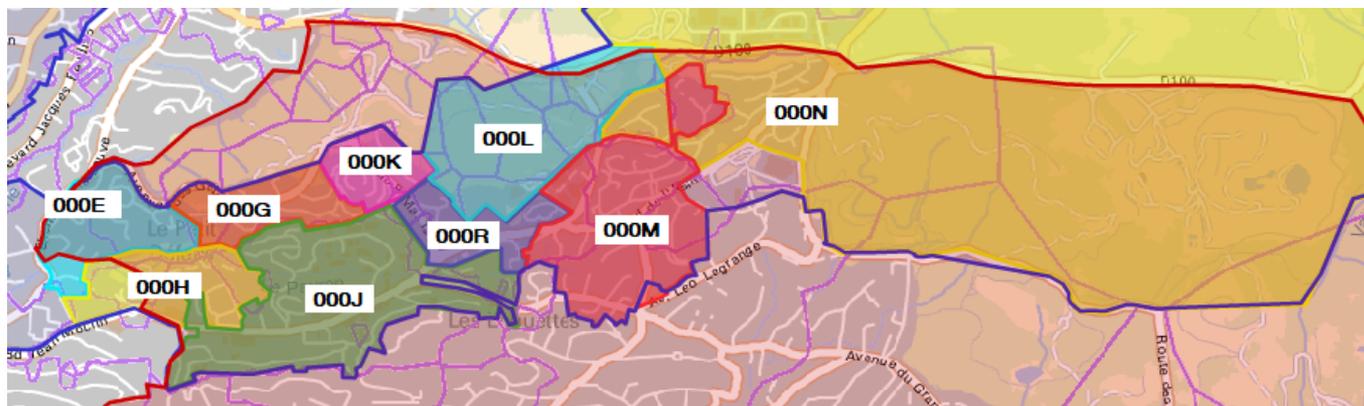


Zone PM	Nbre d'EI concernés	EI adressables	Tx adressables	Eligibles	Tx éligibles
FI-83118-000E	394	394	100%	394	100%
FI-83118-000G	419	393	94%	392	94%
FI-83118-000H	463	462	100%	462	100%
FI-83118-000J	519	433	83%	190	37%
FI-83118-000K	405	405	100%	405	100%
FI-83118-000L	268	268	100%	268	100%
FI-83118-000M	326	326	100%	268	82%
FI-83118-000N	332	332	100%	332	100%
FI-83118-000R	299	299	100%	299	100%
Lot 1	3 425	3 312	97%	3 010	88%

Il reste 415 locaux à rendre éligibles dont :

- 8 immeubles pour 70 locaux avec une négociation syndic en cours
- 95 immeubles pour 183 locaux en études
- 122 immeubles pour 162 locaux isolés (ne nécessitant pas d'accord syndic) à étudier par notre partenaire

Etat d'avancement du lot 3 au sud et à l'est

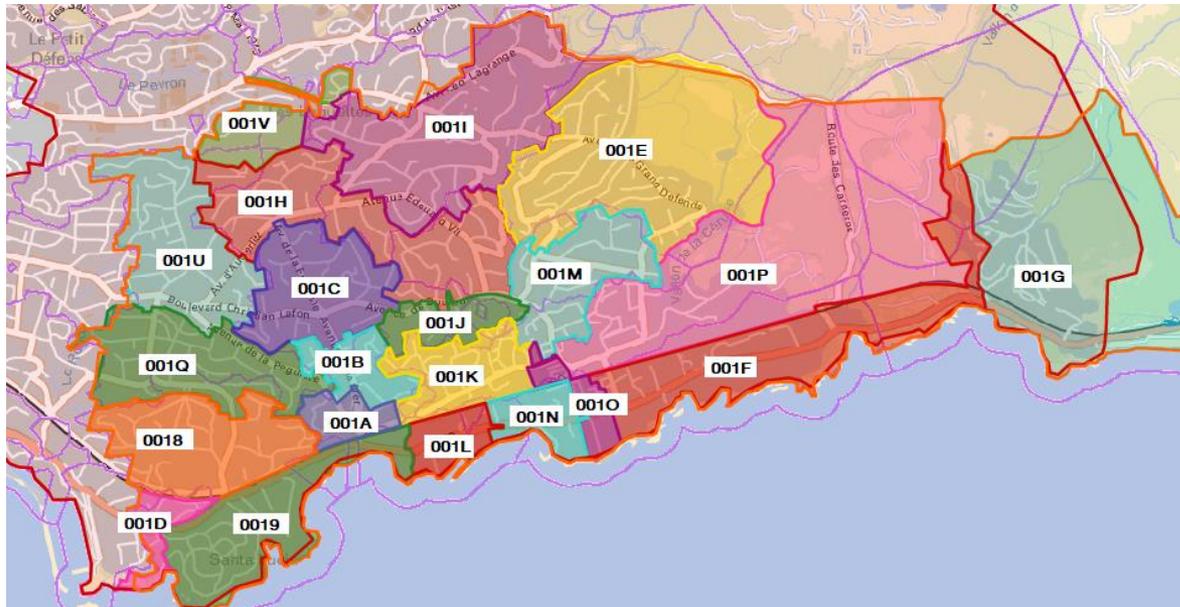

Ce lot démarré en 2017 est à ce jour couvert à **88%** et fait ressortir une éligibilité de **27%**.

Il reste **5 162 locaux** à rendre éligibles dont :

- 829 locaux non adressables
- 26 copropriétés pour 349 locaux avec une négociation syndic en cours
- 436 immeubles pour 1 693 locaux en études chez notre partenaire


- 1678 immeubles pour 1857 locaux isolés à étudier par notre partenaire
- **87 immeubles pour 434 locaux pour lesquels le syndic n'est pas identifié** (liste ci-dessous)



CIL BOULOURIS
lics Non Identifiés

Zone PM	Nbre d'El concernés	El adressables	Tx adressables	Eligibles	Tx éligibles
FI-83118-0018	375	375	100%	82	22%
FI-83118-0019	317	313	99%	21	7%
FI-83118-001A	341	341	100%	268	79%
FI-83118-001B	310	310	100%	202	65%
FI-83118-001C	315	315	100%	71	23%
FI-83118-001D	197	175	89%	0	0%
FI-83118-001E	324	303	94%	56	17%
FI-83118-001F	308	308	100%	76	25%
FI-83118-001G	416	400	96%	155	37%
FI-83118-001H	389	377	97%	88	23%
FI-83118-001I	514	514	100%	94	18%
FI-83118-001J	297	297	100%	138	46%
FI-83118-001K	319	208	65%	0	0%
FI-83118-001L	361	359	99%	166	46%
FI-83118-001M	351	351	100%	65	19%
FI-83118-001N	314	314	100%	234	75%
FI-83118-001O	331	331	100%	100	30%
FI-83118-001P	326	0	0%	0	0%
FI-83118-001Q	399	285	71%	58	15%
FI-83118-001U	375	375	100%	44	12%
FI-83118-001V	201	0	0%	0	0%
Lot 3	7 080	6 251	88%	1 918	27%

Etat d'avancement des lots 2 et 5 à l'ouest

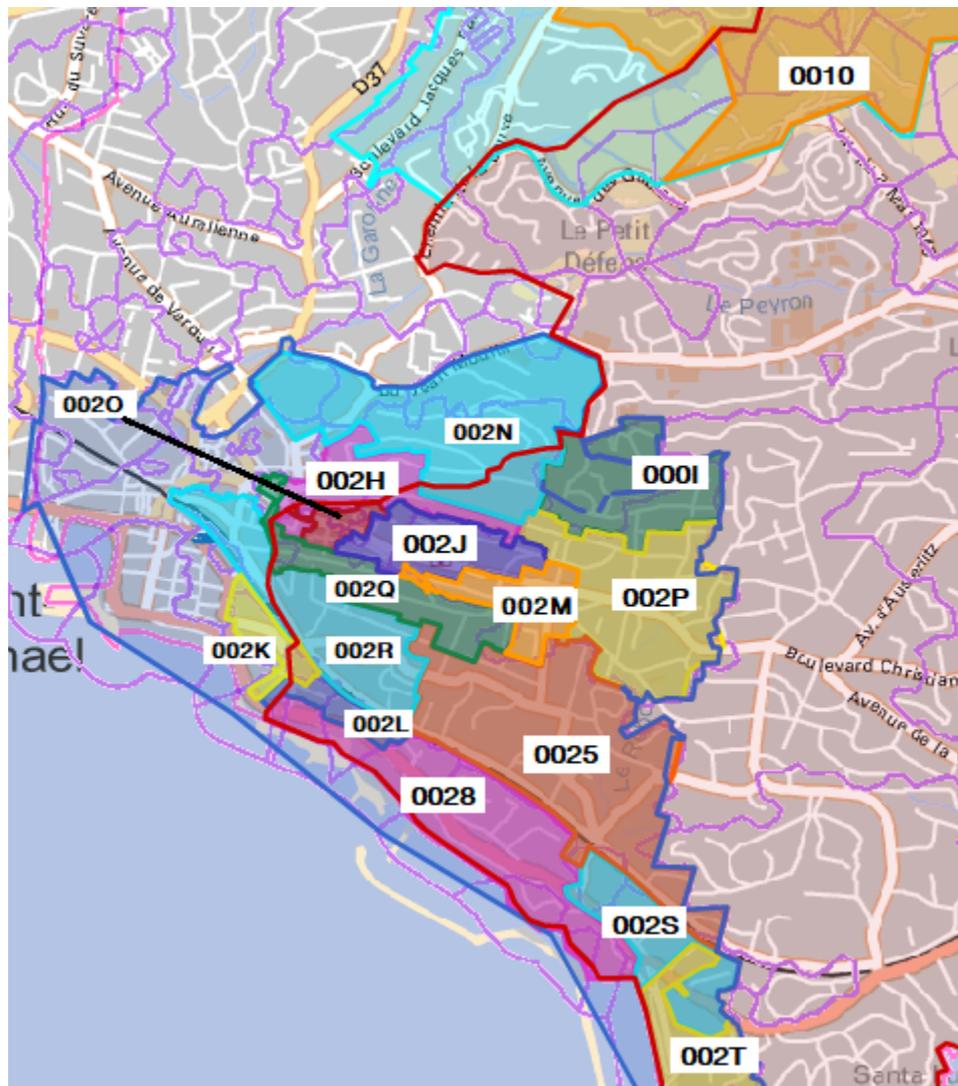

Zone PM	Lot	Nbre d'EI concernés	EI adressables	Tx adressables
FI-83118-0001	5	361	361	100%
FI-83118-0025	5	344	344	100%
FI-83118-0028	5	332	332	100%
FI-83118-002H	5	162	92	57%
FI-83118-002J	5	361	334	93%
FI-83118-002K	5	44	0	0%
FI-83118-002L	5	268	0	0%
FI-83118-002M	5	404	404	100%
FI-83118-002N	5	46	0	0%
FI-83118-002O	5	295	295	100%
FI-83118-002P	5	350	350	100%
FI-83118-002Q	5	291	291	100%
FI-83118-002R	5	148	0	0%
FI-83118-002S	5	505	504	100%
FI-83118-002T	5	363	363	100%
FI-83118-0010	2	81	17	21%
Lot 5		4 355	3 687	85%


Le lot 5 a démarré fin 2018. A ce jour couvert à 85 %, le déploiement se poursuit et sera finalisé d'ici fin 2019 : 15 armoires sont déployées et 4 sont en cours. Les premiers éligibles sont attendus au T3 2019.

A ce jour, nous n'avons pas réussi à identifier les syndics pour 78 adresses concernant 517 locaux sur cette partie du CIL (fichier ci-contre)



CIL BOULOURIS -
Syndics Non Identifié

Synthèse Boulouris

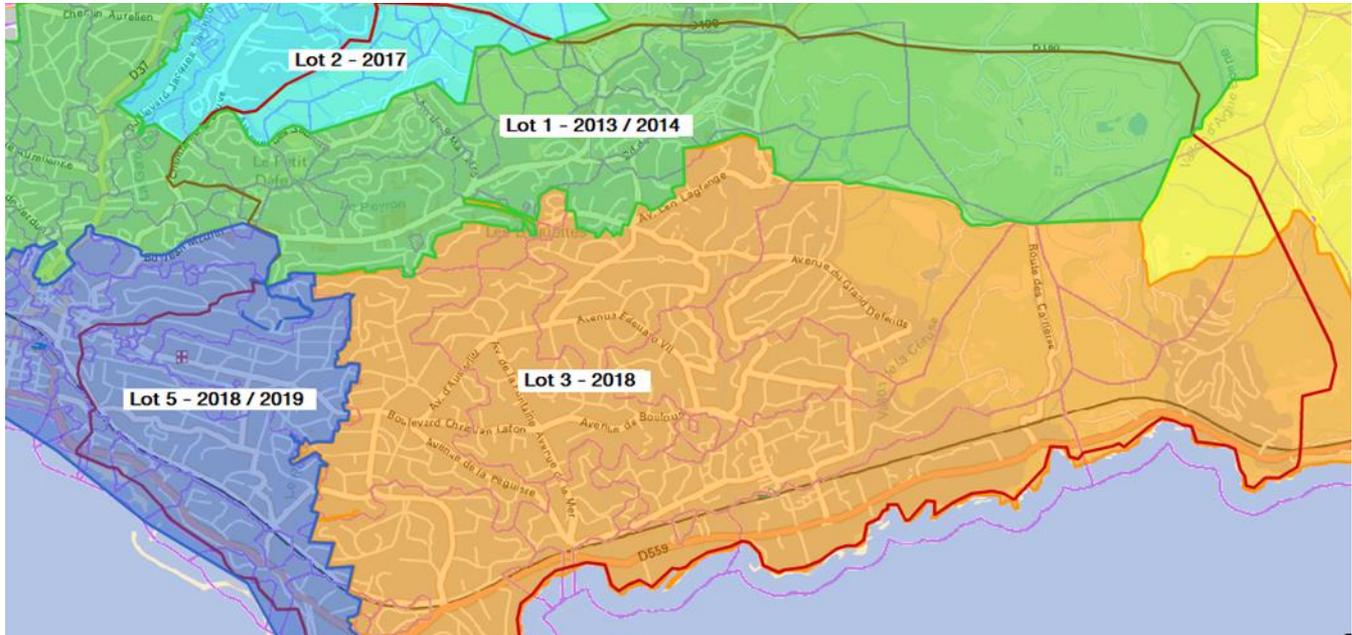

Zone PM	Nbre d'EI concernés	EI adressables	Tx adressables	Eligibles	Tx éligibles
Lot 1	3 425	3 312	97%	3 010	88%
Lot 2	81	17	21%	0	0%
Lot 3	7 080	6 215	88%	1 918	27%
Lot 5	4 274	3 670	86%	0	0%
Total CIL	14 860	13 214	89%	4 928	33%

Une éligibilité à La Fibre de **33%** sur le périmètre du quartier Boulouris à fin mai.
 La totalité des locaux sera éligible fin 2020 si accord syndic dans les temps.




SNI - CIL
 JLOURIS 22052019.

Le contact chez le partenaire **Scopelec** est : jljanoli@groupe-scopelec.fr

Comment savoir si je suis éligible ?

- sur le Portail Orange :

<http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre>

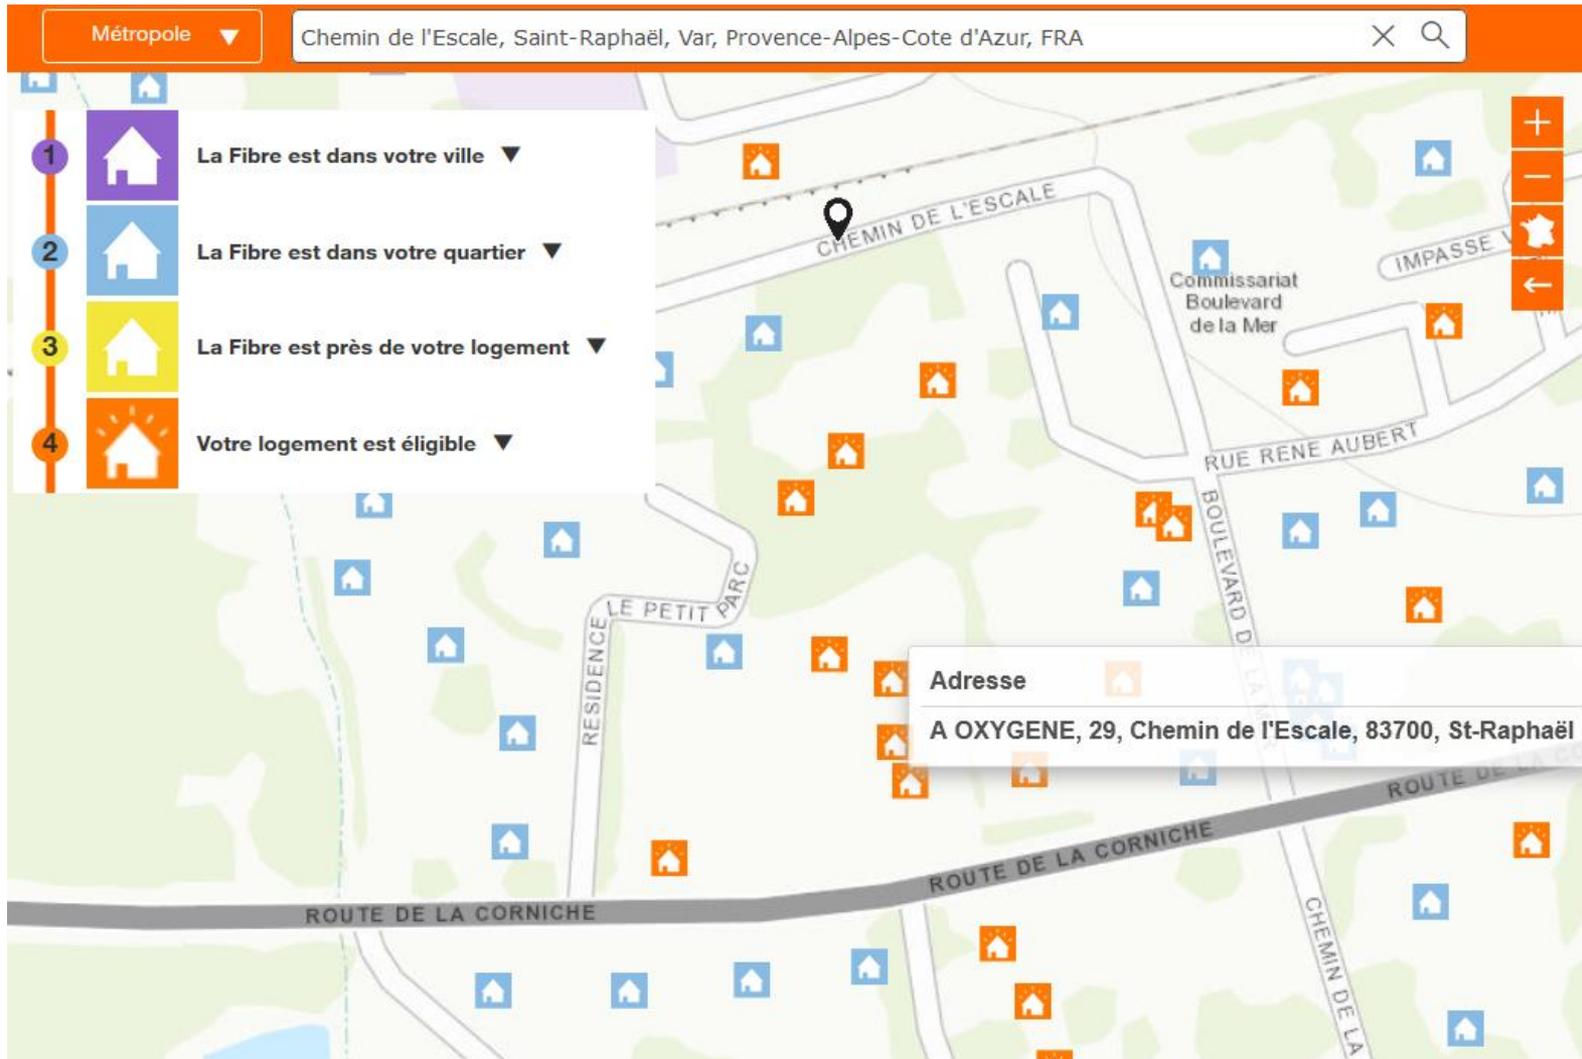

Comment suivre le déploiement ?

- ❑ toujours sur le site d'orange, en remplissant le questionnaire ci-dessous

Votre logement est éligible à la Fibre ?

Découvrez les offres Livebox et Open Fibre.

[Testez votre ligne et découvrez les offres Fibre d'Orange](#)

Votre domicile, votre quartier ou votre ville ne sont pas encore raccordés ?

[Tenez-vous au courant de l'arrivée de la Fibre](#)

[Découvrez comment avoir la Fibre chez vous](#)

❑ Pourquoi ?

1. je suis informé quand mon logement devient éligible

Comment savoir si je suis éligible ?

- sur le Portail de l'Arcep avec mise à jour trimestrielle :
<https://cartefibre.arcep.fr>



merci

